



H.XIV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.



OOMSAPAS
LOS CABOS

PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES

- **Obligación 34 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, establecida en el Artículo 68 de la LGCG).- Programas con Recursos federales: 2021**

Al 31 de diciembre, cuarto trimestre de 2021



Oficio No.: CEA/DG.-085/2022.

Asunto: Avances físicos – financieros PROAGUA 2021.

La Paz, B.C.S., 16 de febrero de 2022.

Ing. Ismael Rodríguez Piña

Director General del OOMSAPAS Los Cabos
Presente

Con relación a las acciones a ejecutar por el OOMSAPAS de Los Cabos, dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio presupuestal 2021, derivado del Tercer Modificatorio al Anexo de Ejecución PROAGUA número 03-01/2021 y Anexo Técnico número 01/2021, de las Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Localidades Urbanas y Rurales.

Al respecto y en seguimiento a oficio número B00.903.03.-0201 de fecha 08 de febrero del presente año, signado por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Baja California Sur, me permito remitir a Usted, debidamente validado los formatos de Avance Físico y Financiero, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022.

Sin otro particular, reciba Usted mi consideración distinguida.

Atentamente



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



**COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE B C S**

C.c.p.- Ing. Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa.- Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad.- Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.
JCVT/ucc

**Dirección Local Baja California Sur.
Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.**

Asunto: Validación de avances Físico-Financieros de recursos PROAGUA 2021

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua (CEA)
Presente

En atención a su oficio No. CEA/DG. -065/2022, de fecha 31 de enero de 2022 mediante el cual nos envía para revisión 4 tantos originales del formato de Avance Físico y Financiero de obras y acciones del PROAGUA 2021, de las acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades urbanas y rurales, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero del 2022.

Adjunto al presente, me permito enviar 3 tantos de original de los Avances Físico Financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como el mes de enero de 2022 debidamente validados para lo procedente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director Local



C. c. e. p. **Ing. José Luis Espinoza Chollet.** - Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y Atención a Emergencias. - Edificio
JCVT/jlech/cagv/mavg/2022

Calle Chiapas 2535, entre Encinas y Legaspy, Col Los Olivos Código Postal, 23040 La Paz B. C. S. Teléfono:612 12 3 69 20
www.gob.mx/conagua



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 29 DE OCTUBRE 2021

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción	
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	

Datos requeridos

102

Fecha de Inicio de la Obra :	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra :	31/12/21
------------------------------	----------	--------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	23.131005, -109.811255
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2324918		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021	Fecha Fallo	27/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Terminación Contrato	31/12/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,872,306.27	\$ -	\$ -	\$ 4,732,818.78	\$ -	\$ 8,605,125.05

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.48%	34.14%	35.38%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,622,842.12	\$ 2,937,789.69	\$ 3,044,493.24	\$ 8,605,125.05

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	50.00%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept.	\$ -	\$ -
Octubre	\$ 4,302,562.50	\$ 1,936,153.12
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 4,302,562.50	\$ 1,936,153.12

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Sept.		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Victor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Pina
Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 29 DE NOVIEMBRE 2021

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION: 2/2021U0313
Descripción de la Obra / Acción
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.
Fecha de Inicio de la Obra: 01/10/21 Fecha Terminación de la Obra: 31/12/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 23.131005, -109.811255
Inversión Ejercida
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros Avance Físico (%)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EXPEDIENTE
No. CompraNet 2324918 Tipo de Contratación Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación 07/09/2021 Fecha Presenta Propuestas 22/09/2021 Fecha Fallo 27/09/2021
Fecha Inicio Contrato 01/10/2021 Fecha Termino Contrato 31/12/2021
Inversión CONTRATADA
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma
\$ 3,872,306.27 \$ - \$ - \$ 4,732,818.78 \$ - \$ 8,605,125.05

Datos requeridos 102

Table with 11 columns: Mes (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total) and Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%) values.

Table with 11 columns: Mes (Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sept, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total) and Avance Financiero Mensual PROGRAMADO (\$) values.

Table with 3 columns: MES, FÍSICO (%), and OBSERVACIONES. Shows cumulative physical progress from 0% in March to 68.36% in December.

Table with 3 columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, and INVERSIÓN FEDERAL. Shows cumulative financial investment from 0 in March to 5,882,837.39 in December.

Table titled 'Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)' with columns for months (Marzo to Diciembre) and corresponding photos of the plant.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua
Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña
Director General

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos
Ing. Ismael Rodríguez Piña
Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO

Fecha: 31-dic-21

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		2/2021U0313	
Descripción de la Obra / Acción			
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		23.131005, -109.811255	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Avance Físico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación
Fecha de Publicación		07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas
Fecha Inicio Contrato		01/10/2021	Fecha Término Contrato
			22/09/2021
			31/12/2021
			27/09/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00
			Otros (FISE)
			\$ -
			Suma
			\$ 8,700,000.00

Datos requeridos

102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	Se reporta este avance ya que los equipos estan solamente suministrados, ser reportara un avance significativo cuando estos esten instalados, probados y funcionando
Total Acumulado	73.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	\$ -	\$ -
Abril	\$ -	\$ -
Mayo	\$ -	\$ -
Junio	\$ -	\$ -
Julio	\$ -	\$ -
Agosto	\$ -	\$ -
Sept	\$ -	\$ -
Octubre	\$ 4,302,562.50	\$ 1,936,153.12
Noviembre	\$ 1,580,274.89	\$ 711,123.70
Diciembre	\$ -	\$ -
Total Acumulado	\$ 5,882,837.39	\$ 2,647,276.82

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)		
MES	Fotografía 1	Fotografía 2
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: URBANO Fecha: 28-ene-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:		2/2021U0313	
Descripción de la Obra / Acción			
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.			
Fecha de Inicio de la Obra:	01/10/21	Fecha Terminación de la Obra:	31/12/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		23.131005, -109.811255	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
Otros			
N/A			
Avance Físico (%)			
N/A			
EXPEDIENTE			
No. CompraNet	2324918		Tipo de Contratación
Licitación Pública Nacional			
Fecha de Publicación	07/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2021
Fecha Inicio Contrato	01/10/2021	Fecha Termina Contrato	31/12/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 3,915,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,785,000.00
Otros (FISE)		Suma	
\$ -		\$ 8,700,000.00	


Datos requeridos
102

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30.50%	34.100%	35.40%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,653,500.00	\$ 2,966,700.00	\$ 3,079,800.00	\$ 8,700,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	50.00%	
Noviembre	18.36%	
Diciembre	5.00%	
Enero	11.00%	
Total Acumulado	84.36%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	4,302,562.50	1,936,153.12
\$	1,580,274.89	711,123.70
\$	-	-
\$	-	-
\$	5,882,837.39	2,647,276.82

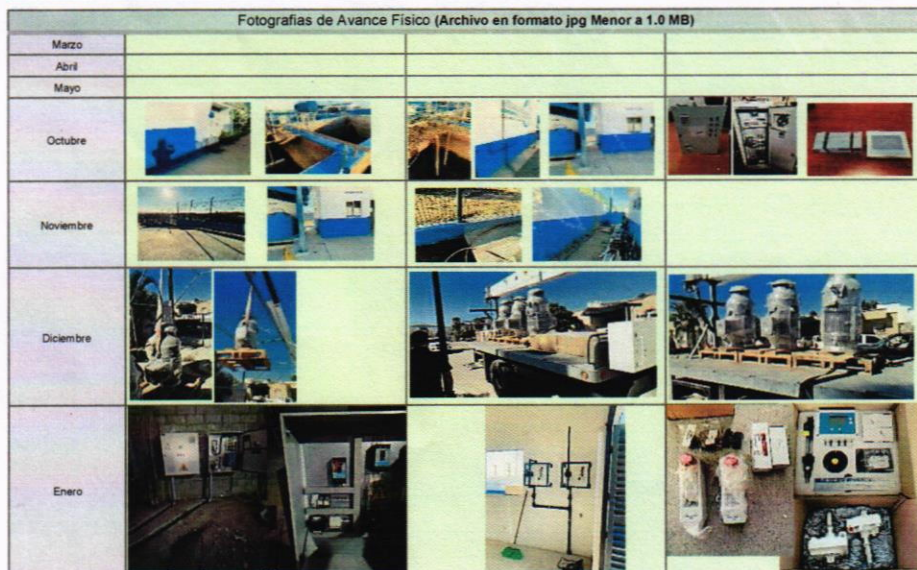

Por el Ejecutivo Federal
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Víctor Manuel Castañón Arcos
 Director Local

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasiña
 Director General

Por el Ejecutivo Municipal
 Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable
 Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

Ing. Ismael Rodríguez Piña
 Director General
